2025年第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目绩效评价报告

陕卓远绩评字〔2026〕020号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

预算单位：陇县水利局

联系电话：0917-3609761

日　　期：2026年6月10日

2025 年第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目绩效评价报告

陇县水利局：

为进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16 号）、《陇县财政局关于开展 2025 年度财政重点绩效评价工作的通知》（陇财办绩〔2026〕4 号）等文件要求，陕西卓远启航企业管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于 2026 年 5 月 12 日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对贵单位实施的“2025 年第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目”开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称：2025 年第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目

2.预算单位：陇县水利局

3.项目预算：600,000.00元

4.项目内容：（1）2025年8月16日—2025年8月22日为牙科集中供水水厂送水租赁4台社会水车组织开展了第二轮抗旱应急送水工作，共计送水80车次；南峡沟集中供水应急补水项目，通过蒲峪水厂清水池向南峡沟片区供水管网泵送补水，日补水量600m，满足南峡沟水厂供水范围内居民生活用水需求；（2）新建蒲峪河扫帚沟口水源补水泵站1座，埋设DN160PE管道300m，购安水泵1台，电缆线300m，控制柜1台；新建蒲峪水厂至南峡沟水厂管网补水泵站1座，埋设DN110PE管道2300m，购安水泵2台，电缆线30m，控制柜1台及其他供水辅助设施。

5.预期效益：通过项目的实施，进一步提升项目区供水保障水平和供水质量，提高工程运行管理水平，提高群众用水满意度，助力乡村振兴。项目的建成将改善农村缺水片区饮水需求，确保年度供水工程安全运行，改善农村生产生活条件，促进农村经济社会全面、协调和可持续发展。

（二）项目预算资金安排情况

1.项目资金预算情况

2025年9月24日，陇县财政局以《关于下达2025年第二批中央水利救灾（抗旱）资金的通知》（陇财办农专〔2025〕150号）文件，下达专项资金600,000.00元。

2.项目资金到位情况

2025年9月24日，县财政资金拨付指标足额到位

600,000.00 元，预算资金到位率为 100.00%。（详见表 1）

表 1　项目预算资金到位情况表　　单位：元

序号	指标文号	预算资金	实际到位资金	资金到位率	到位时间
1	陇财办农专〔2025〕150 号	600,000.00	600,000.00	100.00%	2025.9.24
合 计		**600,000.00**	**600,000.00**	**100.00%**	-

（三）项目预算资金执行情况

2025 年度项目预算资金结余 600,000.00 元，相关资金结转至 2026 年安排拨付。截至本次绩效评价日，累计拨付至项目实施单位 599,934.30 元，资金执行率 99.98%。（详见表 2）

表 2-1　项目预算资金执行情况表　　单位：元

序号	项目名称	实际到位资金	实际支出资金	预算执行率
1	2025 年第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目	600,000.00	599,934.30	99.98%
合 计		**600,000.00**	**599,934.30**	**99.98%**

表 2-2　项目预算资金执行情况表（明细）　　单位：元

序号	支付项目摘要	支出金额	支付时间
1	陇县自来水公司	202,500.00	2026.3.25
2	陕西方源正达项目管理咨询有限公司	8,000.00	2026.3.25
3	陕西康慧建设工程有限公司	100000.00	2026.2.13
4	陕西康慧建设工程有限公司	202,434.30	2026.3.25
5	陕西康慧建设工程有限公司	55,000.00	2026.3.25
6	苟江涛	6,800.00	2026.2.13
7	陕西永安宏达建筑工程有限公司	8,000.00	2026.2.13
8	张明新	8,400.00	2026.2.13
9	陕西鼎鸿盛鑫实业有限公司	8,800.00	2026.2.13
合计		**599,934.30**	

（四）绩效目标完成情况

项目各项建设及应急供水任务均按实施方案、既定工期全部按期完工落地：一是2025年8月16日—8月22日落实4台社会水车，实施第二轮抗旱应急送水，累计送水80车次；二是依托蒲峪水厂清水池向南峡沟片区管网应急补水，日均补水600m³，保障缺水片区群众日常生活用水；三是按期建成扫帚沟口、蒲峪至南峡沟两处补水泵站，完成配套PE管网铺设、水泵、电缆、控制柜及附属辅助设施采购安装，项目建设工程量、建设时限、应急供水保障等绩效目标全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中、省、市、县现行相关政策文件；

2.陇县财政局相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观地反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价内容

1.财政资金投入分配。主要包括项目立项（论证决策、目标设置、保障措施），以及资金落实（到位时效、分配合理）。

2.财政资金运行管理。主要包括资金管理（资金支付规范性、支出合理性），以及事项管理（实施程序、管理情况）。

3.财政资金管理制度。主要包括资金管理制度（制度健全性、执行有效性）。

4.财政资金绩效实现。主要包括经济性（体现为预算成本控制），效率性（体现为项目进度及质量），效果性（体现为社会、经济、环境效益及可持续性），以及公平性（体现为公众满意度）。

（四）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（五）评价标准

2025年第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、24个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。（详见表4）

表 4　评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	S≥90	90＞S≥80	80＞S≥60	S＜60

（六）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 13 分，得分 12 分。（详见表 5）

表 5　项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
合计	**13**	-	-	**13**	**12**

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目立项符合国家相关法律法规和政策规定，与部门职责范围相符，符合国家财政专项资金支持方向。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目绩效目标紧扣区域干旱缺水、群众饮水困难的现实民生需求，围绕应急送水保供、管网应急补水、补水泵站及配套管网工程建设内容设定绩效目标，立项目的与项目实施内容、群众用水诉求高度契合，项目目标设定贴合当地供水实际，整体设置科学合理。项目分别从临时应急供水、长效水源补充工程两个方面谋划实施内容，通过水车应急拉水、现有水厂跨片区补水、新建补水泵站铺设输水管道多措并举保障群众饮水安全，目标导向清晰、立项依据充分。

（2）绩效指标明确性方面。项目各项绩效指标量化程度较高，可核查、可衡量，指标设置较为规范。其中抗旱应急送水指标明确实施时段、投入水车数量、送水总车次；应急补水指标细化日均补水量、受益群众人数；工程建设指标对新建泵站数量、不同规格PE管道铺设长度、水泵、电缆、控制柜及配套附属设施数量全部予以量化列明。但项目绩效指标体系在细分设置、分值设置、层级设置上存在几点不足：一是产出数量指标仅设置“农村供水工程项目个数1个”单一三级指标，未结合项目年度核心实施目标拆分量化分项，项目核心工作包含抗旱应急送水、管网补水、泵站及管线设备建设三类核心任务，仅以“项目个数”作为数量考核依据，无法完整覆盖年度总体目标中的送水频次、日供水规模、工

程实物数量等信息，绩效量化考核缺乏针对性，难以直观对比计划任务与实际完成工程量；二是生态效益指标下设三级指标“新增水土流失综合治理面积”，该指标已纳入考核清单，但未分配对应考核分值，指标打分体系存在填报疏漏，预算绩效管理精细化执行水平有待提升；三是可持续影响下设的三级指标，“工程是否达到设计使用年限”与“工程类项目设计使用年限”两项指标考核内容高度重合，均围绕工程设计年限开展评价，存在指标重复堆砌、指标体系设置不精简的问题，违背绩效指标简洁清晰、维度不重叠的设置原则。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目预算编制科学精准，预算金额与实际需求一致，建设内容与预算列支科目匹配，整体编制较为规范。

（2）资金分配合理性方面。项目资金围绕应急水车送水、跨片区应急补水、两座补水泵站及配套管线设备安装等建设内容统筹分配，资金投向与项目实施内容、群众饮水保障需求相对应，重点用于抗旱保水民生支出，资金使用方向合规。整体资金分配投向精准、分配合理。

评价组认为，项目立项合规、定位精准、资金规范、导向清晰。绩效目标紧扣区域干旱缺水、群众饮水困难的民生需求，贴合项目应急供水、长效供水工程建设实施内容，目标设置科学合理。项目预算编制规范精准，资金分配紧扣核心建设任务和民生保障需求，投向合规、重点突出，能够有

效保障项目落地实施，切实缓解区域饮水安全问题，民生保障成效显著。同时绩效指标体系存在不足，影响了绩效评价精准度。一是产出数量指标单一，未对应应急送水、管网补水、泵站及管线建设三大核心任务细化分项指标，无法全面精准考核项目实施成效；二是分值设置存在疏漏，纳入评价的生态效益指标未配置对应考核分值，打分体系不完整；三是可持续影响指标内容重合、设置冗余，指标体系精简性、规范性不足。综合评价，项目决策整体可行。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分13分。（详见表6）

表6　项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	2
合计	**15**	-	-	**15**	**13**

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。2025年9月24日，陇县财政局以陇财办农专〔2025〕150号文件下达中央水利救灾（抗旱）专项资金600,000.00元，项目预算指标全额下达到位，资金到位率100.00%。

（2）预算执行率方面。项目2025年度预算资金全额结转至2026年统筹使用。截至绩效评价日，项目资金已拨付到位，拨付率99.98%。已拨付资金全部合规用于项目应急送水、

管网补水、泵站及配套设施建设等相关内容，资金使用真实规范。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目严格遵循行业现行规章制度及管理办法，覆盖项目前期决策、采购招投标、合同履约、工程建设、竣工验收、资料归档等全实施环节，现行制度依据完备、管控体系健全，能够全面规范项目建设管理全流程，项目实施全过程均严格对照制度标准落地执行，合规性、规范性整体良好。但单位内部自行制定的管理制度存在不完善之处，相关制度文件均未标注制定落款日期，制度资料完整性有待进一步提升。

（2）制度执行有效性方面。项目全过程严格落实既定管理制度及项目实施方案，规范开展项目组织实施、工程建设、资金使用、竣工验收等各项工作，项目各项抗旱供水任务、工程建设内容均按期保质完成，已拨付资金使用合规、支出真实合法。存在以下问题：一是合同文本会审复核流程执行不严，项目施工合同“陇县 2025 年南峡沟集中供水应急补水工程”载明施工天数为 30 天，开工日期 2025 年 11 月 7 日，计划完工日期本应为 2025 年 12 月 7 日，却误填写为 2026 年 12 月 7 日，合同关键工期信息存在明显错误，文件审核把关缺位。

评价组认为，该中央水利救灾（抗旱）项目资金保障充足、支出管理规范，组织实施体系完善、制度落地成效较好，整体管理运行规范有序，但单位内部精细化管理存在以下不足：一是内部自制管理制度归档不规范，制度文件缺失制定落款日期，档案资料完整性不足；二是制度落地执行存在漏洞，施工合同核心工期信息出现年份错填，事前审核把关缺位。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分13分。（详见表7）

表7　项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	**13**	—	—	**13**	**13**

1.经济成本方面。项目预算资金600,000.00元，实际完成支付599,934.30元，经济成本方面控制好。

2.社会成本方面。项目为抗旱应急民生保障类项目，实施初衷为解决区域干旱缺水、群众饮水困难问题，项目实施全过程科学统筹、规范组织。项目应急送水、管网补水、泵站及配套设施建设过程中，未干扰群众正常生产生活秩序、民生扰动等不良社会影响。项目实施以保障民生为核心，最大限度地降低了社会投入与社会负担，无额外社会治理成本及负面社会成本支出。

3.生态成本方面。该项目的实施对生态环境没有造成影

响。因此，无自然生态环境负作用。

评价组认为，项目经济成本控制较好，社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态环境的负作用。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分25分。（详见表8）

表8　项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	23	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目完成及时率	5	5
合计	**23**	—	—	**25**	**25**

1.产出数量方面。从相关方面统计报表等资料显示及现场检查情况看，项目已全面完成既定产出任务，顺利实施抗旱应急送水、南峡沟片区管网应急补水、两处补水泵站建设及配套管网、设备采购安装等全部规划内容。

2.产出质量方面。各项供水保障工程及应急处置任务均按标准落地见效。持续落实第二轮抗旱应急供水保障举措，累计组织应急送水80车次，解决缺水片区饮水短缺问题；充分盘活蒲峪水厂现有清水池蓄水能力，常态化向南峡沟缺水片区开展管网应急补水，日均稳定补水600立方米，持续保障片区居民基本生活用水不间断；严格对照项目建设时序要求，按期建成扫帚沟口、蒲峪至南峡沟两处补水泵站主体工程，全面完成配套PE输水管网铺设施工，同步完成水泵、电力电缆、控制柜及各类附属辅助设备的采购、安装与调试工

作，项目产出质量管控到位。

3.产出时效方面。经梳理项目全过程实施资料核查，中央水利救灾（抗旱）资金项目各项建设任务均按期落地，其中应急抗旱送水、供水管网埋设、补水泵站及配套设施建设等工程内容均按计划完工，现已全面完成项目专项审计。

评价组认为，项目各项产出指标落实到位、完成质量良好。项目足额落实资金投入，全面完成各项应急供水及工程建设任务，产出数量达标；工程建设规范合规，质量验收合格，产出质量可靠；项目严格依照合同工期推进实施，按期完工验收，产出时效达标。整体来看，项目各项产出绩效目标均全部完成，项目实施落地见效，有效达成预期建设及民生保障成效。

（五）效益

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、服务对象满意度六个方面进行评价。项目效益满分为34分，得分为28分。（详见表9）

表9　项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	34	经济效益	促进区域经济发展情况	5	5
		社会效益	区域居民用水安全提升情况	3	3
			道路供水配套设施改善情况	3	3
		生态效益	干旱期水资源节约与生态用水保障情况	5	4
		可持续影响	后期管护及长效运行保障机制建设情况	5	4
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	受益群众用水保障满意度、认可程度	10	9
总分	**34**			**34**	**28**

1.经济效益方面。项目为抗旱应急民生保障类公益性水利项目，不以经营性收益为目的，经济效益主要体现为防灾减损、节约群众用水成本、保障农村生产生活稳定等方面。项目通过应急送水、管网补水及新建补水泵站、配套管网设施，有效解决了区域干旱缺水难题，避免了因持续干旱导致的群众外购高价用水、农业生产受限、日常生产停滞等经济损失，大幅降低了干旱灾害带来的民生经济负担。项目资金使用高效节约，预算执行规范，未产生额外运维成本及浪费支出，以有限财政资金实现最大化抗旱保供成效，切实发挥了财政资金惠民减负、防灾保产的经济效益。

2.社会效益方面。项目社会效益显著，有效保障了陇县南峡沟片区群众干旱期间基本生活用水安全，彻底缓解了区域季节性干旱缺水、供水不足的突出民生问题。项目通过短期应急送水补水、长期补水泵站及管网配套建设相结合的方式，补齐了片区供水保障短板，提升了区域干旱灾害应急处置能力和农村供水保障能力，有效维护了群众正常生产生活秩序，消除干旱缺水引发的民生矛盾及不稳定因素。项目实施切实回应群众急难愁盼，提升了群众用水安全感、获得感和满意度，助力巩固乡村振兴民生保障基础，社会效益良好。

3.生态效益方面。项目施工周期短、施工范围可控，建设及运行全过程严格遵守生态环境保护相关要求，无废水、废气、固废等污染物排放。项目通过科学补水、规范供水调度，稳定区域水资源循环，有效缓解干旱期水资源短缺压力，避免了因干旱缺水导致的局部水资源枯竭、生态用水不足等

问题。同时项目存在以下不足：项目实施阶段，施工噪音对沿线村居造成短期扰动。总体来看，项目生态正向成效突出，整体生态效益表现良好。

4.可持续影响。项目建成的两处补水泵站、输水管网及配套设备设施为区域抗旱供水重要基础设施，硬件设施工况稳定，能够长期发挥应急供水保障作用，具备长效服务能力。但在查阅项目全套资料的过程中，未核查到设施后期管护方案、运维台账、管护人员配置、运维经费保障等长效运维相关佐证资料。

5.受表彰情况。2025 年度第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目未获得中、省、市与主要履职相关的表彰奖励。

6.满意度方面。通过问卷调查、实地访谈等方式对项目服务对象进行满意度调查，共发放问卷 25 份，回收有效问卷 25 份。结果显示，居民对项目整体满意度达到 90%。多数群众对项目实施给予了肯定和认可。

评价组认为，项目有效降低干旱灾害经济损失、节约民生用水成本，经济效益稳健；切实保障万千群众饮水安全、维护社会民生稳定，社会效益显著；未产生生态负面扰动、助力区域水资源良性循环，生态效益良好；长效水利设施建成投用，持续提升区域供水保障能力，可持续影响长远。

四、综合评价结论

2025 年第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目立项依据充分、立项程序规范，项目实施紧扣区域抗旱保水民生需求，绩效目标整体合理、导向清晰。项目财政资金足额到位、资

金使用合规规范，预算执行率较高，资金使用效益良好；项目实施全过程严格遵循行业管理制度及建设规范，工程建设流程完整、管控有序，按期完成全部建设内容及应急供水保障任务，项目产出数量、产出质量、产出时效均圆满达成预期目标。项目经济、社会、生态及可持续发展效益良好，有效解决了项目区群众干旱缺水难题，切实提升了农村供水保障能力和民生服务水平，群众满意度较高。同时，项目全过程管理存在不足，单位内部管理制度归档不规范、工程合同审核把关不严、绩效自评工作不够细致，但均未影响项目整体落地成效及核心绩效产出。经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为91分，整体评价结论为“优秀”。（得分情况详见附件2）

五、存在问题

（一）制度与内控管理不完善。一是内部管理制度归档不规范，水利局单位内部管理制度未标注制定落款日期，制度完整性不足，不利于内控考核及档案归档；二是工程合同会审机制流于形式，南峡沟应急补水工程施工合同工期填写错误，完工年份填写偏差一年，合同关键核心条款复核校验不严，项目事前、事中文书审核履职不到位，项目精细化管理水平不足。

（二）绩效目标与指标设置不规范。一是产出指标设置不严谨。绩效自评仅设置“农村供水工程项目个数1个”单一量化指标，未拆分应急送水车次、日均补水量、管网铺设长度、泵站建设数量等分项考核指标，无法匹配项目多类型

实施内容，自评考核无法真实反映任务完成体量；二是效益指标填报疏漏。生态效益项下“新增水土流失综合治理面积”三级指标纳入考核清单，但未配套分值，指标体系赋分缺失，自评打分逻辑不闭环；三是可持续指标重复堆砌。自评表设置两项内容高度重合的工程年限考核指标，指标冗余重叠，违背绩效指标精简、独立、可量化编制原则。

（三）长效运维管护机制缺失。项目两座补水泵站、输水管网及机电配套设施完工投用后，评价组在整理项目资料中未看到专项后期管护方案、专职管护人员台账、常态化运维检修记录、年度运维经费保障文件等佐证资料，后期管网检漏、设备维保、冬季防冻运维工作无制度支撑。

六、建议

（一）健全内控审核体系，抓实项目精细化管理。一是全面梳理水利抗旱、供水工程内部管理制度，补齐所有制度制定落款日期、修订日期，完善制度审批签章，统一归档成册，建立制度动态修订台账；二是建立工程合同“经办人+科室负责人+法务+财务”四方会审机制，重点核验工期、价款、工程量、履约时限核心条款，建立合同复核台账，杜绝文字、年限、工程量低级错误。

（二）规范绩效目标与指标设置管理。一是对标财政绩效管控要求，重构水利救灾项目绩效自评指标体系。拆分应急供水、基建工程两大板块，细化送水车次、日补水量、管道长度、设备台套等细分数量化产出指标，删除重复考核指标，补齐生态效益缺失分值，保证指标独立、量化、可核验；

二是建立绩效自评前置审核机制，项目自评报告、绩效表上报前，由单位内部先行审核把关，逐项校验指标设置、数据填报、分值分配、从源头规避指标设置不细化、填报疏漏等问题，切实发挥绩效自评整改提升作用。

（三）完善长效运维管护机制。尽快完善片区补水泵站、供水管网专项后期管护方案，明确专职管护人员岗位职责、日常巡检频次、设备维保标准；建立“日常巡检+季度检修+冬季防冻”常态化运维台账，完善工程管护全套资料；落实设施属地管护责任，实现工程建设、运维管护无缝衔接，最大化发挥水利供水设施长效抗旱保供效益。

附件：

1.绩效考评组成员表

2.项目绩效评价得分表

3.评价单位营业执照

陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

2025 年 6 月 10 日

附件 1

绩效考评组成员表

祁　盼　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师

张珊珊　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师

万静静　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司审计师

史雅倩　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师

王　苗　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师


周　莎　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师

附件 2

2025 年第二批中央水利救灾（抗旱）资金项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	2
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
效益	34	经济效益	促进区域经济发展情况	5	5
		社会效益	区域居民用水安全提升情况	3	3
			道路供水配套设施改善情况	3	3
		生态效益	干旱期水资源节约与生态用水保障情况	5	4
		可持续影响	后期管护及长效运行保障机制建设情况	5	4
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	受益群众用水保障满意度、认可程度	10	9
合计	100	—	—	100	91

附件 3

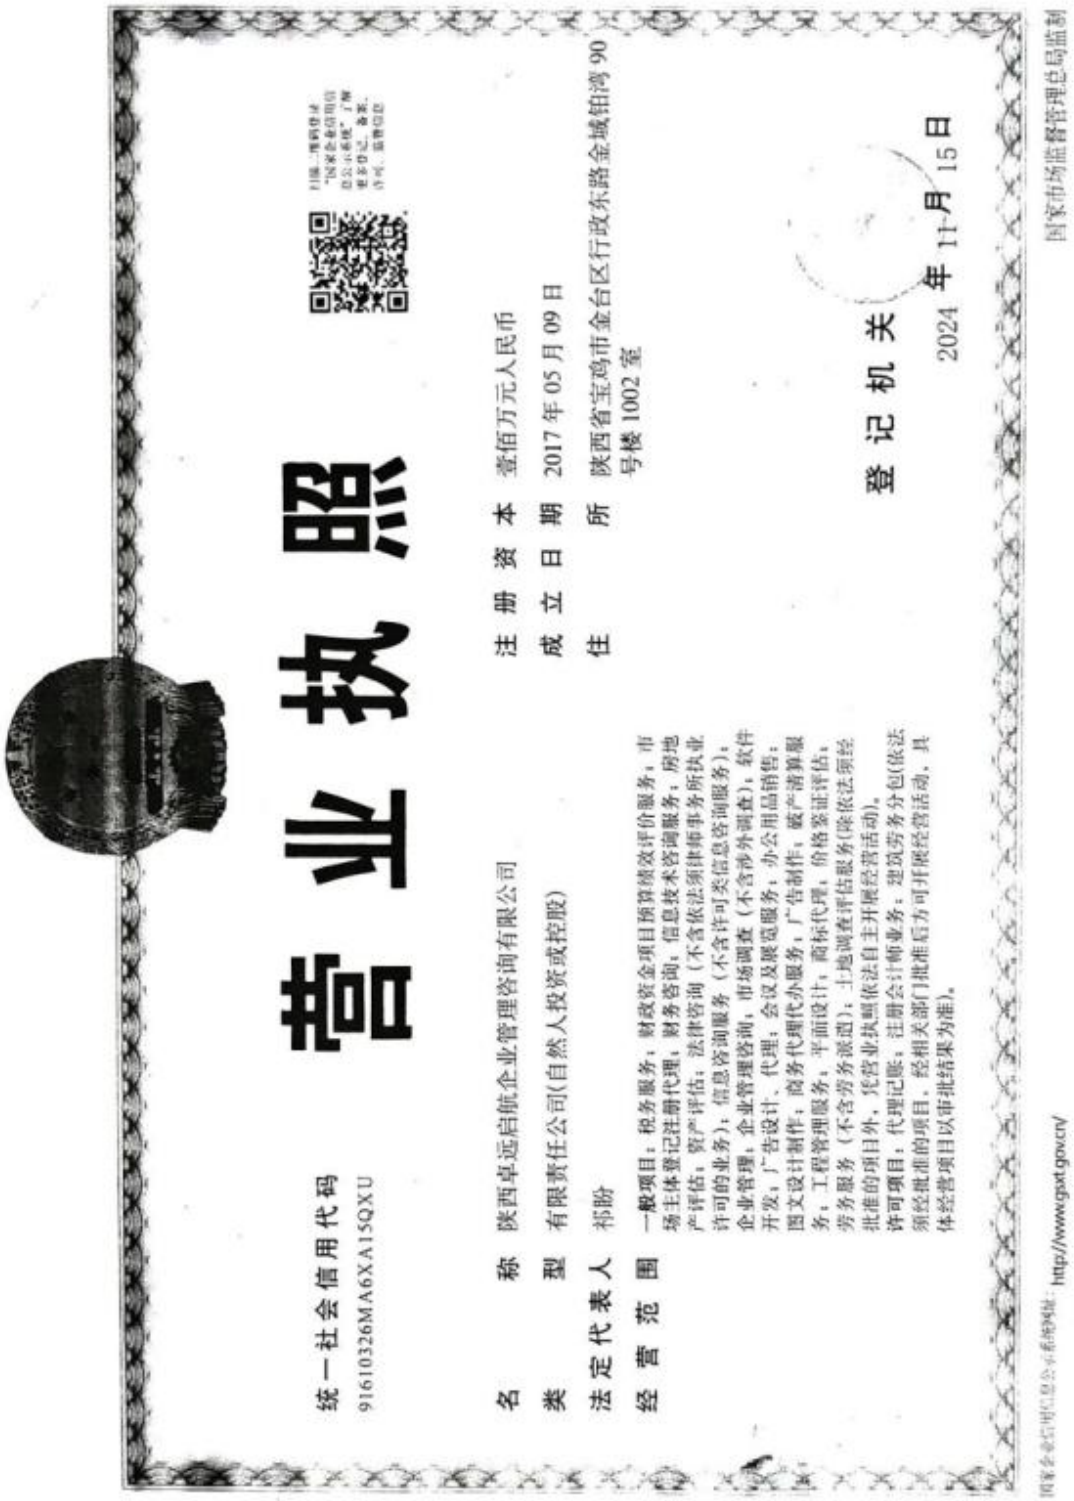

统一社会信用代码

91610326MA6XA15QXU

营业执照

名　　称　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　祁盼

经营范围　一般项目：税务服务，财政资金项目预算绩效评价服务，市场主体登记注册代理，财务咨询，信息技术咨询服务，房地产评估，资产评估，法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理，企业管理咨询，市场调查（不含涉外调查），软件开发，广告设计、代理，会议及展览服务，办公用品销售；图文设计制作，商务代理代办服务，广告制作，破产清算服务，工程管理服务，平面设计，商标代理，价格鉴证评估，劳务服务（不含劳务派遣）；土地调查评估服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：代理记账，注册会计师业务，建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注 册 资 本　壹佰万元人民币

成 立 日 期　2017 年 05 月 09 日

住　　所　陕西省宝鸡市金台区行政东路金域铂湾 90 号楼 1002 室

登记机关　2024 年 11 月 15 日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/
