2025年度省级城镇化发展专项资金
绩效评价报告

陕卓远绩评字〔2026〕024号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

预算单位：陇县住房和城乡建设局

联系电话：0917-3609761

日　　期：2026年6月10日

2025 年度省级城镇化发展专项资金绩效评价报告

陇县住房和城乡建设局：

为进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16 号）、《陇县财政局关于开展 2025 年度财政重点绩效评价工作的通知》（陇财办绩〔2026〕4 号）等文件要求，陕西卓远启航企业管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于 2026 年 5 月 13 日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对贵单位实施的“2025 年度省级城镇化发展专项资金”开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称：2025 年度省级城镇化发展专项资金

2.预算单位：陇县住房和城乡建设局

3.项目预算：10,000,000.00 元

4.项目内容：对陇县老城区北大街、东大街、西大街、尚德路共计 4 条道路的污水管网进行改造，铺设 d300-d600 污水管道 3767 米（其中北大街铺设 d300-d500 钢筋混凝土管道 616 米、东大街铺 d300-d500 钢筋混凝土管道 1288 米、西大街铺设 d300-d600 钢筋混凝土管道 788 米、尚德路铺设 d300-d400 钢筋混凝土管道 1075 米），并设置检查井 108 座（其中北大街设置检查井 23 座、东大街设置检查井 45 座、西大街设置检查井 17 座、尚德路设置检查井 23 座）等辅助设施。

5.项目计划实施期限：2025 年 1 月—2025 年 12 月。

6.预期效益：通过项目的实施，进一步提升项目区排污设施水平，实现雨污分流排放，规范排污秩序，有效改善区域人居环境与水环境质量，切实提升群众获得感与满意度。

（二）项目预算资金安排情况

1.项目资金预算情况

2025 年 5 月 13 日，陇县财政局以《下达 2025 年度省级城镇化发展专项资金》陇财办建专〔2025〕66 号文件，下达专项资金 10,000,000.00 元。

2.项目资金到位情况

截至评价日，2025 年度省级城镇化发展资金下达总金额为 10,000,000.00 元，累计分两批次实际到位资金 1,800,000.00 元，预算资金到位率为 18.00%。（详见表 1）

表 1　项目预算资金到位情况表　　单位：元

序号	指标文号	预算资金	实际到位资金	资金到位率	到位时间

序号	指标文号	预算资金	实际到位资金	资金到位率	到位时间
1	陇财办建专〔2025〕66 号	10,000,000.00	1,000,000.00	10%	2025.5.13
			800,000.00	8%	2026.2.12
合 计		10,000,000.00	1,800,000.00	18%	

（三）项目预算资金执行情况

2025 年度项目预算资金 10,000,000.00 元，累计实际到位资金 1,800,000.00 元，全部资金已足额拨付至项目实施单位，累计拨付金额 1,800,000.00 元，资金执行率 100%；（详见表 2）

表 2　项目预算资金执行情况表　　单位：元

序号	项目名称	实际到位资金	实际支出资金	预算执行率
1	2025 年度省级城镇化发展专项资金	1,800,000.00	1,800,000.00	100%
合 计		1,800,000.00	1,800,000.00	100%

（四）绩效目标完成情况

项目划分为 4 个施工标段分步实施建设，各标段既定管网铺设、检查井配套建设工程量均已全部落地：一标段陇县东大街地下污水管网改造铺设 D300-D500 钢筋混凝土管道 1288 米、新建检查井 45 座；二标段陇县北大街地下污水管道改造铺设 D300-D500 钢筋混凝土管道 616 米、新建检查井 23 座；三标段陇县西大街雨水管道更新改造铺设 D300-D600 钢筋混凝土管道 788 米、新建检查井 17 座；四标段陇县尚德路雨水管道更新改造铺设 D300-D400 钢筋混凝土管道 1075 米、新建检查井 23 座。目前，项目全部工程施工内容已完工，实体建设工程量绩效目标已完成，仅一、二标段完成初步验收，

整体项目尚未完成全部竣工验收工作。未及时进行工程竣工审计和财务审计。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中、省、市、县现行相关政策文件；

2.陇县财政局相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观地反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价内容

1.财政资金投入分配。主要包括项目立项（论证决策、目标设置、保障措施），以及资金落实（到位时效、分配合理）。

2.财政资金运行管理。主要包括资金管理（资金支付规范性、支出合理性），以及事项管理（实施程序、管理情况）。

3.财政资金管理制度。主要包括资金管理制度（制度健

全性、执行有效性）。

4.财政资金绩效实现。主要包括经济性（体现为预算成本控制），效率性（体现为项目进度及质量），效果性（体现为社会、经济、环境效益及可持续性），以及公平性（体现为公众满意度）。

（四）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（五）评价标准

项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、24个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。（详见表3）

表3　评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值S	S ≥ 90	90 ＞ S ≥ 80	80 ＞ S ≥ 60	S ＜ 60

（六）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观

倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 13 分，得分 11 分。（详见表 4）

表 4　项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	1
合计	13	-	-	13	11

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目立项符合国家相关法律法规和政策规定，与部门职责范围相符，符合国家财政专项资金支持方向。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。老城区地下污水管网项目绩效目标紧扣城镇污水管网提质改造、雨污分流整治、市政基础设施完善、人居环境提升等政策导向设定，逻辑清晰、层级完整。

（2）绩效指标明确性方面。老城区地下污水管网项目各

项绩效指标量化程度较高，可核查、可衡量，指标设置较为规范。但绩效指标明确性存在以下不足：一是污水管道长度指标目标值设定与项目批复不一致，项目批复管网建设长度3767米，指标设定为6200米，考核标准与立项批复不符，衡量基准不清晰；二是缺少检查井独立量化考核指标，关键产出无明确衡量标准。项目批复需配套建设检查井108座，仅在总体目标中文字笼统提及，未设置单独三级量化指标，无法精准考核配套设施完成情况；三是指标细化拆分不足，对应关系模糊。年度总体目标未将管网、检查井建设明细分别对应至产出三级指标，指标设置不明确。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目预算编制科学合理，预算内容与项目内容相匹配，依据充分。

（2）资金分配合理性方面。项目到位资金合计1,800,000.00元已全部拨付，资金执行率100%。资金按照施工标段进行分配拨付，其中一标段拨付400,000.00元、三标段拨付1,000,000.00元、四标段拨付400,000.00元，二标段暂未拨付工程款。整体资金分配存在不均衡问题：项目四个标段污水管网改造工程已全部完工，但资金投放未结合各标段完工工程量统筹均衡安排，二标段无资金拨付，工程款支付进度与工程完工进度不匹配，资金分配统筹性不足。

评价组认为，陇县老城区地下排水管道更新改造项目立项环节合规到位，项目立项依据充分、立项程序完整规范，完全符合城镇污水管网提质改造、雨污分流治理相关政策方

向。但项目在绩效目标编制、绩效指标设置、到位资金分配三大管理环节均存在不足之处：一是绩效目标设置不合理，管网改造目标工程量与项目批复文件不符，同时未将批复 108 座检查井纳入量化年度目标，总体目标未能全覆盖全部批复建设内容，完整性不达标；二是绩效指标清晰量化程度不足。虽整体指标具备可核查基础，但管网长度考核基准数值，缺少检查井独立三级量化考核指标；年度总体建设任务未与细分产出指标一一对应分解，关键产出缺少清晰、可落地的考核衡量标准，指标明确性存在不足；三是到位资金标段分配统筹性不合理。截至评价日到位 180 万元资金已全额支出，但四个施工标段工程均已完工，资金拨付未结合各标段实际完工工程量均衡调度，二标段未拨付任何工程款，资金支付进度与工程完工进度不匹配，资金分配均衡性、合理性不足。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 12 分。（详见表 5）

表 5　项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	2
			预算执行率	4	4
			资金使用合规性	4	4
		组织实施	管理制度健全性	2	1
			制度执行有效性	2	1
合计	15	-	-	15	12

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。截至评价日，2025 年度省级城镇化发展资金下达总额为 10,000,000.00 元，累计分两批实际

到位资金 1,800,000.00 元，预算资金到位率为 18%。

（2）预算执行率方面。2025 年度城镇化专项资金项目累计实际到位资金 1,800,000.00 元，全部资金已足额拨付至项目实施单位，累计拨付金额 1,800,000.00 元，资金执行率 100%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。未提供项目资金、工程建设、绩效监控等相关管理制度文件，项目实施无成文制度管控依据，管理制度体系不健全。

（2）制度执行有效性方面。实施单位未建立项目资金、工程建设、绩效监控成套管理制度，项目实施缺少标准化制度作为执行依据，未形成常态化依规管控机制。虽然项目四个施工标段按期完工，到位资金拨付手续完备、资金支出合规，支付环节未发现违规行为，但相关管理工作无制度条款对照落实，制度执行有效性不足。

评价组认为，项目资金管理规范到位，到位资金全额拨付、预算执行进度良好、资金使用合规无违规问题，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。项目全程依规实施，四个标段均按期完工，制度执行有效。但内部制度体系空白是核心管理问题，需尽快梳理、制定覆盖项目资金管理、工程建设、绩效全过程监控的配套管理制度，

明确各环节操作流程、管理权责，实现项目实施有制度可依、按制度执行，全面提升项目规范化管理水平。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分13分。（详见表6）

表6　项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1.经济成本方面。项目已全面完成3767米污水管网、108座检查井的建设任务，项目施工所需主材、辅材及人工费用均据实核算、合规定价，严格把控采购及用工成本，未出现材料、人工费高价采购及虚高列支情况，整体建设成本严格控制在概算范围内，经济成本良好。

2.社会成本方面。项目实施改造老城区四条道路雨污管网，有效解决老旧管网排水不畅、污水溢流等民生问题，改善城区水环境与居民居住环境，惠及沿线群众，群众满意度较高。项目施工期间短时间占用道路、产生扬尘噪声，对周边居民出行、日常生活造成短暂影响，项目整体实施无社会负面影响和作用。

3.生态成本方面。该项目的实施对生态环境没有造成影响。

评价组认为，项目经济成本、社会成本方面、生态环境成本方面无影响生态环境的负作用。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 23 分。（详见表 8）

表 8　项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	9
		产出时效	项目完成及时率	5	4
合计	**25**	—	—	**25**	**23**

1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目已全面完成了 3767 米污水管网、108 座检查井的建设任务。

2.产出质量方面。截至评价日，一标段陇县东大街地下污水管网改造铺设 D300-D500 钢筋混凝土管道 1288 米、新建检查井 45 座；二标段陇县北大街地下污水管道改造铺设 D300-D500 钢筋混凝土管道 616 米、新建检查井 23 座；三标段陇县西大街雨水管道更新改造铺设 D300-D600 钢筋混凝土管道 788 米、新建检查井 17 座；四标段陇县尚德路雨水管道更新改造铺设 D300-D400 钢筋混凝土管道 1075 米、新建检查井 23 座项目。四个标段建设内容已全面完工，现阶段仅一、二标段完成初验。

3.产出时效方面。从项目实施相关资料来看，老城区地下污水管网改造项目，合同约定项目周期：一标段 2025 年 5 月 12 日—2025 年 11 月 8 日，二标段 2025 年 5 月 12 日—2025 年 9 月 11 日，三标段 2025 年 5 月 10 日—2025 年 9 月 10 日，四标段 2025 年 5 月 12 日—2025 年 10 月 9 日，项目严格对照

既定工期计划有序推进各项标段污水管网工作，按期完成全部施工内容，项目整体实施进度有序可控，未出现工期滞后、进度延误、延期完工等情况，严格按时完成各阶段实施任务，圆满达成项目既定时效绩效。目前项目仅一二标段完成初步验收，其他标段还未开展初步验收工作，整体竣工验收手续尚未办结。

评价组认为，项目产出成效整体较好，各标段管道、检查井等建设任务全部完成，产出数量达标；工程施工符合设计标准，实体质量合格；各标段均严格依照合同工期完工，无延误超时情况，时效目标顺利实现。但项目整体竣工验收手续尚未办结，验收、质量评定流程未完全闭环，后续需加快完善全部标段验收工作。

（五）效益

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、服务对象满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 34 分，得分为 29 分。（详见表 7）

表 7　项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	34	经济效益	促进区域经济发展情况	5	5
		社会效益	区域居民用水安全提升情况	4	4
			道路供水配套设施改善情况	4	4
		生态效益	改善生态环境质量情况	4	4
		可持续影响	后期管护及长效运行保障机制建设情况	4	3
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度、项目受益人认可程度	10	9
总分	**34**			**34**	**29**

1.经济效益方面。项目完成四条老旧道路雨污管网升级

改造，补齐城区排水基础设施短板，减少管网破损渗漏、污水外溢维修养护频次，降低城区管网后期运维修缮成本；规范沿线商户、居民排污秩序，减少水污染治理外置支出，间接节约水环境治理资金，具备长效经济型赋能作用。

2.社会效益方面。项目完成全域管网雨污分流改造，优化城区地下排污体系，解决老城区管网老旧、排水不畅、雨天积水等民生问题，改善片区出行及居住环境，筑牢城区市政民生保障基础，切实惠及沿线常住居民，提升城区民生保障水平，社会正向效益显著。

3.生态效益方面。通过新建标准化污水管网、配套检查井设施，实现生活污水统一收集、集中转运处理，有效杜绝污水直排河道、路面淤积等问题，净化城区地表及地下水体环境，改善片区土壤、街巷环境卫生，助力县域水环境提质，生态改善成效明显。

4.可持续影响。通过老城区污水管网改造，完善城区雨污分流排水体系，完善城镇基础设施，能够长效改善区域人居环境与水环境质量，基础设施长期运行效益稳定，具备良好可持续发展价值。但在查阅项目中，未见关于污水管网、配套检查井后期运维管护方案、管护责任主体、管护资金来源、日常巡查维修制度、长效运行管理办法等相关文件、会议记录或制度文件，项目建成后持续稳定运营缺乏制度支撑。

5.受表彰情况。2025 年度省级城镇化发展专项资金项目未获得中、省、市与主要履职相关的表彰奖励。

6.满意度方面。通过问卷调查、实地访谈等方式对项目

服务对象进行满意度调查，共发放问卷 25 份，回收有效问卷 25 份。结果显示，居民对项目整体满意度达到 93%。多数群众对项目实施给予了肯定和认可。

评价组认为，项目综合效益明显，经济效益、社会效益、生态效益成效良好，群众满意度较高，具备稳定的长效运行价值与良好的社会、生态及经济赋能效应。同时，项目实施及资料留存中存在明显短板，现阶段未建立完善的后期运维管理体系，缺失管网及配套检查井管护责任主体、管护资金来源、日常巡查维修制度、长效运行管理办法等相关制度文件与支撑资料，无法为项目建成后常态化、规范化、长效化运营提供制度保障，不利于项目设施功能的持续发挥和效益的长久延续。

四、综合评价结论

2025 年度省级城镇化发展专项资金项目立项依据充分、程序规范，符合城镇化提质及老旧人居环境改造政策，项目按期完成北大街、东大街等 4 条道路全部管网及检查井施工建设，工程实体质量合格，到位专项资金拨付及时、使用合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。项目落地后有效完善城区内涝问题，增强城市防洪排涝能力，助推城市整体风貌，降低管网运维及水环境治理成本，水土生态环境持续改善，群众满意度良好，经济效益、社会效益、生态效益较为突出，具备良好的可持续发展价值。

同时项目全过程管理存在不足：绩效目标编制不规范、绩效指标设置不完善、标段资金拨付不均衡、缺少项目管理

制度、竣工验收滞后、长效运维机制不完善，后续需针对性整改完善，完善项目管理。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为88分，整体评价结论为“良好”。（得分情况详见附件2）

五、存在问题

（一）绩效目标与指标设置不规范。项目绩效目标及三级指标设置存在偏差，与项目批复内容匹配度不足。一是项目批复改造d300-d600污水管网3767米，绩效指标设定为6200米，工程量目标与立项批复不符；二是批复建设的108座检查井未设置独立量化考核指标，仅以文字笼统提及，无法精准核验配套设施建设成效。

（二）资金分配统筹性不足。资金分配不均衡，四个施工标段已全部完工，资金仅拨付一、三、四标段，已完工二标段未拨付工程款，资金拨付进度与工程完工进度不匹配，未结合各标段完工工程量统筹分配资金。

（三）制度与内控管理不完善。项目未建立专项资金管理、工程建设管控、绩效运行监控、项目自评复核等配套管理制度，无成文内控管理依据，项目施工、资金拨付、绩效管控等工作推进，无标准化制度约束；制度无配套体系可执行，项目全流程制度化管控缺位，管理规范性不足。

（四）工程验收闭环滞后，审计流程办结不及时。项目四个标段施工内容全部完工，仅一、二标段完成初步验收，三、四标段未开展初步验收，项目整体竣工验收、工程竣工审计、财务审计均未办结，项目全流程闭环管理不到位。

（五）长效运维管护机制缺失。项目建成后未建立配套长效运行管理体系，无管网及检查井后期运维管护方案、明确管护责任主体、管护资金保障渠道，未制定日常巡查、定期维修养护、隐患排查等常态化管理制度及工作台账，无法持续巩固项目改造成效，制约项目可持续效益发挥。

六、建议

（一）规范绩效目标与指标设置。严格依据项目立项批复、施工图工程量编制年度绩效目标，据实填报管网改造长度3767米，删除不实6200米目标值确保指标数据真实准确；同时补齐指标短板，新增检查井建设数量三级量化考核指标，完善产出数量指标，实现管网、附属设施全内容指标覆盖；理顺总体目标与三级指标对应关系，提升绩效目标合规性、指标量化清晰度，做实事前绩效管理工作。

固化整改成果、健全长效管理机制，后期将持续常态化、规范化推进绩效目标编制工作。一是严把源头编制关口，严格对照立项批复、施工图纸和现场实际工程量核对指标数据，从源头保障绩效目标真实合规、贴合项目实际。二是动态优化指标体系，结合管网改造项目特点，完善三级绩效指标框架，补齐设施配套、工程质量、实施时效、社会效益等考核指标，细化量化标准，实现项目建设内容指标全覆盖。三是规范指标逻辑层级，对标梳理总体目标与细分指标，明确层级支撑关系，确保各项指标可量化、可考核、可溯源。四是完善事前审核机制，建立多级审核流程，重点核查指标设置、数据取值、逻辑关系等关键内容，及时整改不规范问题，持

续提升绩效目标编制精细化、规范化水平，全面夯实项目全过程绩效管理基础。

（二）均衡优化资金拨付分配。优化资金分配机制，严格按照各标段完工工程量、合同结算金额统筹拨付工程款，做到工程款支付与工程进度、完工工程量相匹配，提升资金分配均衡性与使用公平性。

（三）完善内控管理制度，压实制度全流程执行。结合市政管网类项目管理要求，尽快制定单位专项资金管理办法、工程项目建设管理、绩效运行监控、绩效自评内部管理制度，明确资金审批、施工管控、绩效监控、资料归档全流程及岗位职责；依托成文制度开展项目管理工作，实现项目实施有章可循、依规管控，完善制度管理。

（四）加快工程手续办结，闭环项目全过程管理。加快推进三、四标段初步验收工作，尽快完成项目整体竣工验收、工程竣工审计及财务决算审计，完善验收台账、结算资料归档工作，闭环项目施工、验收、审计、结算全流程工作，完善项目工程档案，保障项目合规办结。

（五）建立长效运维机制，保障项目可持续运营。立足项目长效运营需求，尽快出台污水管网及配套检查井后期运维管护专项方案，明确管护责任主体、岗位职责、管护范围，落实常态化运维资金保障渠道。制定日常巡查、定期检修、隐患排查、应急处置等标准化管理制度，建立运维管理工作台账，落实专人负责日常管护工作，实现管网设施常态化、规范化、长效化管护，持续保障管网设施稳定运行，最大化

释放项目生态、民生、经济长效效益。

附件：

1.绩效考评组成员表

2.项目绩效评价得分表

3.评价单位营业执照

陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

2025 年 6 月 10 日

附件 1

绩效考评组成员表

祁　盼　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师

张珊珊　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师

万静静　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司审计师

史雅倩　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师

王　苗　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师


周　莎　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师

附件 2

2025 年度省级城镇化发展资金项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	1
过程	15	资金管理	资金到位率	3	2
			预算执行率	4	4
			资金使用合规性	4	4
		组织实施	管理制度健全性	2	1
			制度执行有效性	2	1
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	9
		产出时效	项目按期完成情况	5	4
效益	34	经济效益	促进区域经济发展情况	5	5
		社会效益	区域居民用水安全提升情况	4	4
			道路供水配套设施改善情况	4	4
		生态效益	改善生态环境质量情况	4	4
		可持续影响	后期管护及长效运行保障机制建设情况	4	3
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度、项目受益人认可程度	10	9
合计	**100**	—	—	**100**	**88**

附件 3

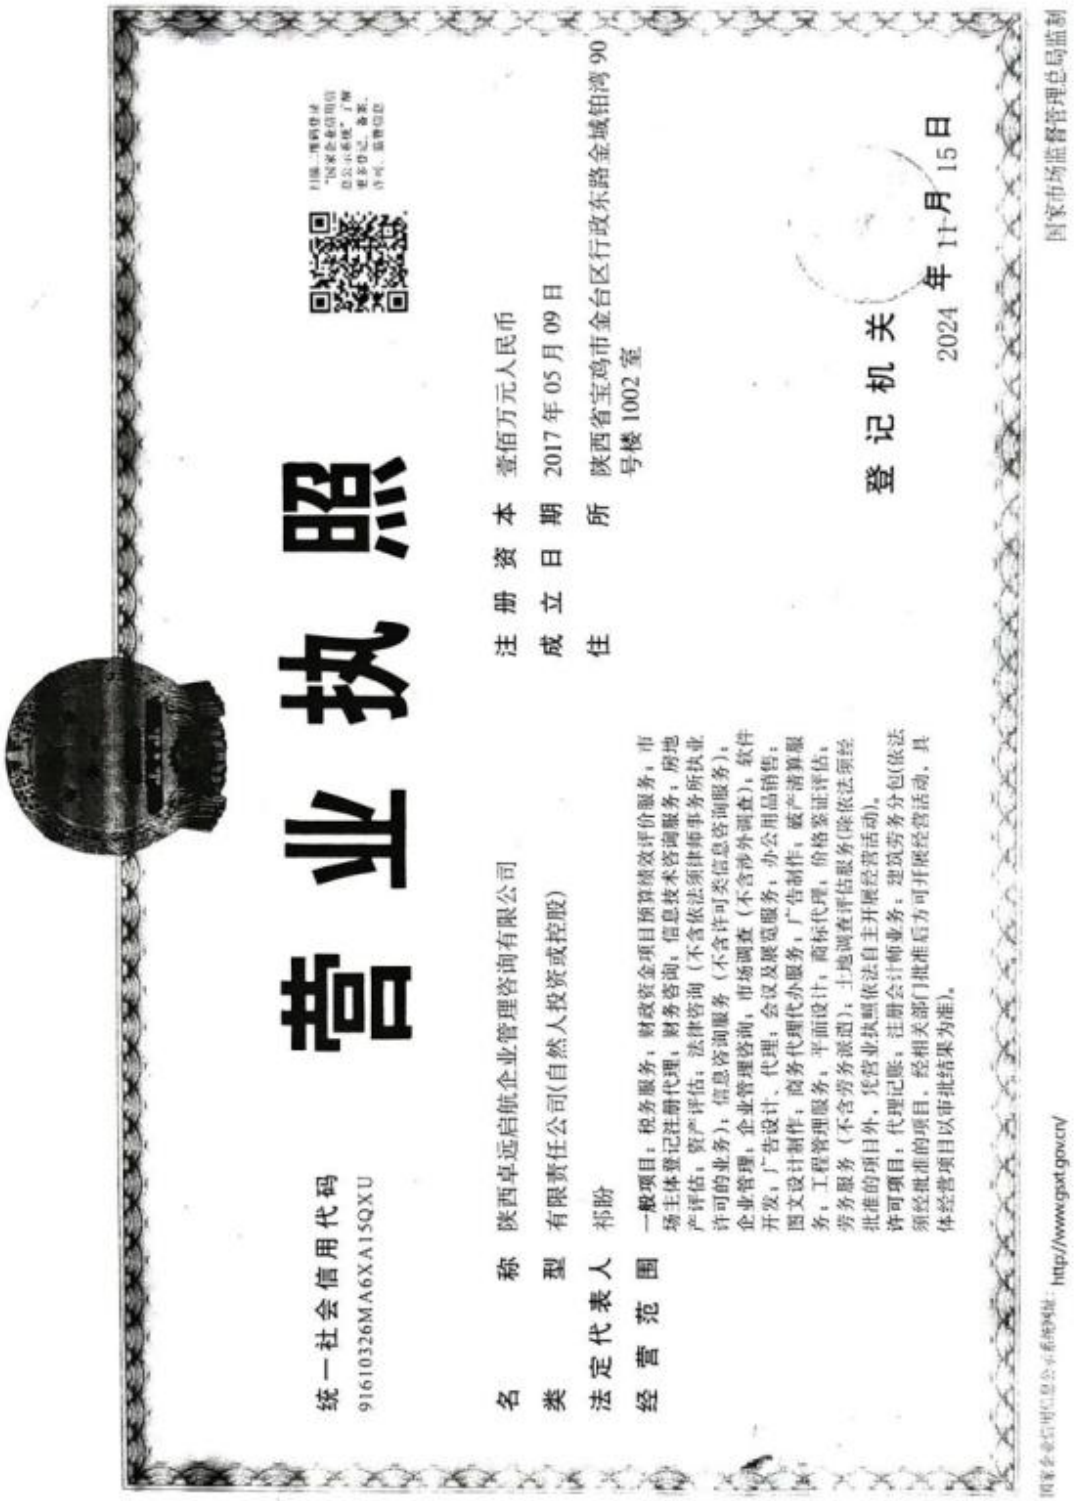

营业执照

统一社会信用代码
91610326MA6XA15QXU

名　　称　陕西卓远启航企业管理咨询有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人　祁盼
经营范围　一般项目：税务服务，财政资金项目预算绩效评价服务，市场主体登记注册代理，财务咨询，信息技术咨询服务，房地产评估，资产评估，法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理，企业管理咨询，市场调查（不含涉外调查），软件开发，广告设计、代理，会议及展览服务，办公用品销售；图文设计制作，商务代理代办服务，广告制作，破产清算服务，工程管理服务，平面设计，商标代理，价格鉴证评估，劳务服务（不含劳务派遣）；土地调查评估服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：代理记账，注册会计师业务，建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注 册 资 本　壹佰万元人民币
成 立 日 期　2017 年 05 月 09 日
住　　所　陕西省宝鸡市金台区行政东路金域铂湾 90 号楼 1002 室

登记机关　2024 年 11 月 15 日

国家市场监督管理总局监制
